

REPORTE SEMANAL DE OBRA 2021-2024

DATOS DE LA ACCIÓN

FECHA DE REPORTE: 07 DE JULIO DE 2023

NOMBRE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MANUEL DOBLADO, TRAMO MIGUEL HIDALGO A CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA COLONIA CENTRO, DE SAN FRANCISCO DEL RINCON."

CONTRATO: INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-002

GUANAJUATO

SAN FRANCISCO DEL RINCÓN

ENTIDAD FEDERATIVA

DELEGACIÓN / MUNICIPIO

NOMBRE DE LA EMPRESA:

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE S.A. DE C.V.

MONTO DEL CONTRATO: \$ 2,239,202.58

AVANCES DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

PERIODO DE CONTRATO: 5 DE JUNIO 2023 AL 18 DE AGOSTO 2023

RECALENDARIZACION

AL

NOMBRE DEL SUPERVISOR:
ARQ. JOSE ISABEL ALVAREZ
BOCANEGRA

PRORROGA

AL

AVANCES	FISICO	95.00%	ESTIMACIONES INGRESADAS	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7
	PROGRAMADO	94.00%	AVANCE FISICO DE LA ESTIMACION							


REPORTE FOTOGRAFICO Y ESTATUS DE OBRA

COMENTARIOS, OBSERVACIONES:

SE TERMINA DE COLOCAR CONCRETO Y ESTAMPADO EN CRUCES PEATONALES EN LA BOCA-CALLE DE HIDALGO ESQ. DOBLADO. SE CALAFATEA JUNTAS EN CONCRETO DE ARROYO.



PAVIMENTO DE CONCRETO Y ESTAMPADO EN PASO PEATONAL EN BOCA CALLE DE DOBLADO ESQ. HIDALGO

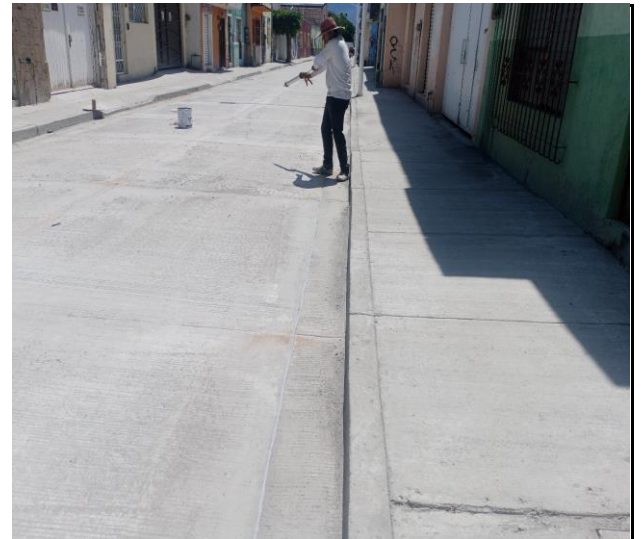

CALAFATEO EN ARROYO
