

REPORTE MES DE OCTUBRE MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD LAS TORTUGAS

FECHA INICIO

01/10/2020

CONCEPTO

CAMINO SACA COSECHAS

UNIDAD



M2

CANTIDAD

870

FECHA TERMINO

01/10/2020

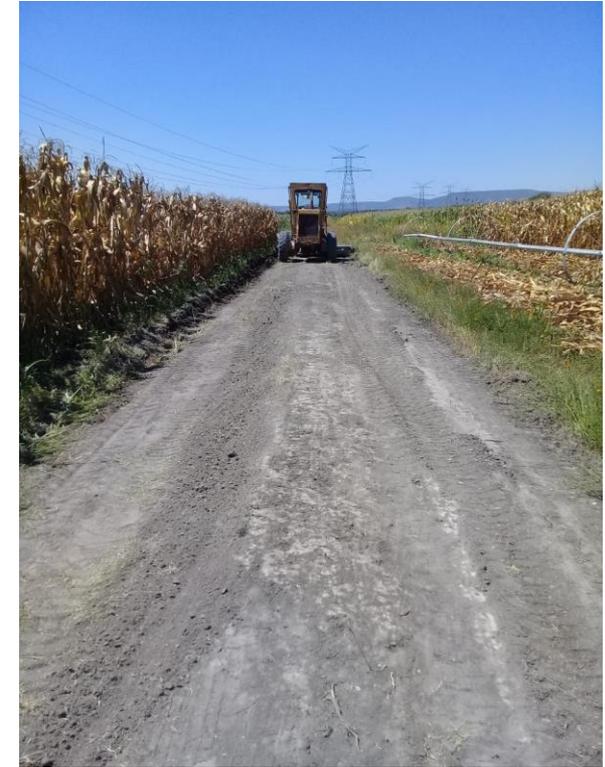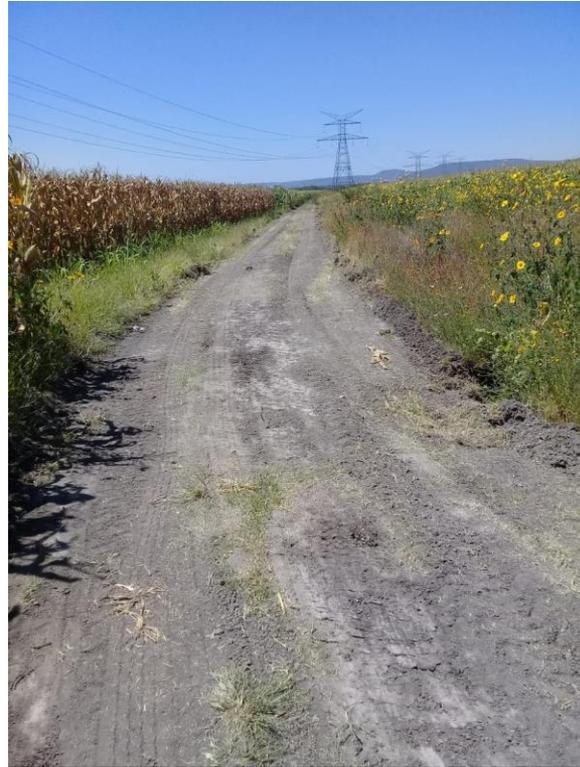

REPORTE MES DE OCTUBRE MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD LA CALERA

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
01/10/2020	CALLE PRINCIPAL	M2	2,592	09/10/2020
	CALLE SANTA CRUZ	M2	1,608	
	CAMINO AL PEDREGOSO	M2	19,200	



CALLE SANTA CRUZ

CAMINO AL PEDREGOSO

REPORTE MES DE OCTUBRE MAQUINARIA

REVESTIMIENTO CON TEPETATE EN LA COMUNIDAD EL PANAL

FECHA INICIO
01/10/2020

CONCEPTO
PRIVADA

UNIDAD
M2


CANTIDAD
1,150

FECHA TERMINO
01/10/2020



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD LA ESTACION

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
01/10/2020	CAMINO AL ALBERGUE CANINO	M2	508	01/10/2020

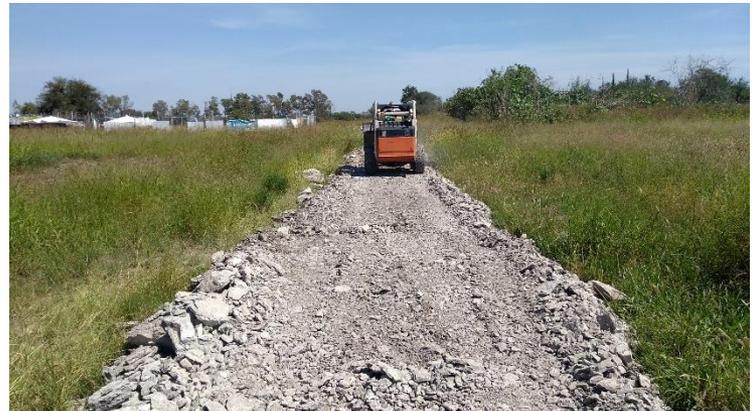

REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD LA CALERA

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
01/10/2020	CALLE PRINCIPAL	M2	2,592	09/10/2020
	CALLE SANTA CRUZ	M2	1,608	
	BACHEO CAMINO AL PEDREGOSO	M2	1,160	



CALLE PRINCIPAL

CALLE SANTA CRUZ

BACHEO CAMINO AL PEDREGOSO

REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD LAS TORTUGAS

FECHA INICIO
02/10/2020

CONCEPTO
CAMINO SACA COSECHAS

UNIDAD
M2

CANTIDAD
4,750

FECHA TERMINO
21/10/2020



REPORTE MES DE OCTUBRE MAQUINARIA

TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPORTIVA J JESUS RODRIGUEZ BARBA

FECHA INICIO

02/10/2020

CONCEPTO

EXTENDER TEPETATE EN AREA DE ALBERCAS
LIMPIEZA DE BASURA EN CICLO PISTA

FECHA TERMINO

05/10/2020



REPORTE MES DE OCTUBRE MAQUINARIA

TRABAJOS DE EXCAVACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
02/10/2020	CALLE NICOLAS BRAVO	ML	185	20/10/2020
	CALLE MARIANO ARISTA	ML	140	
	CALLE GOMEZ FARIAS	ML	125	
	CALLE MARIANO ESCOBEDO	ML	349	
	CALLE MELCHOR OCAMPO	ML	346	
	CALLE EMILIANO ZAPATA	ML	270	
	COSTADO CARRETERA FRENTE A FERRETERIA	ML	42	



REPORTE MES DE OCTUBRE MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD LOMA DEL LIEBRERO

FECHA INICIO

05/10/2020

CONCEPTO

CALLE CASHIL

UNIDAD



M2

CANTIDAD

850

FECHA TERMINO


05/10/2020

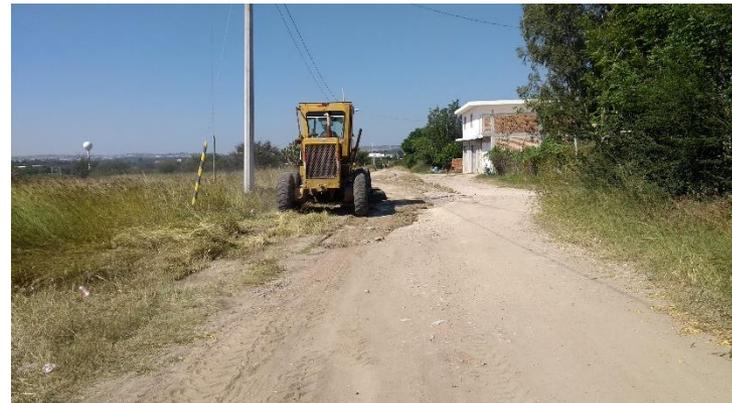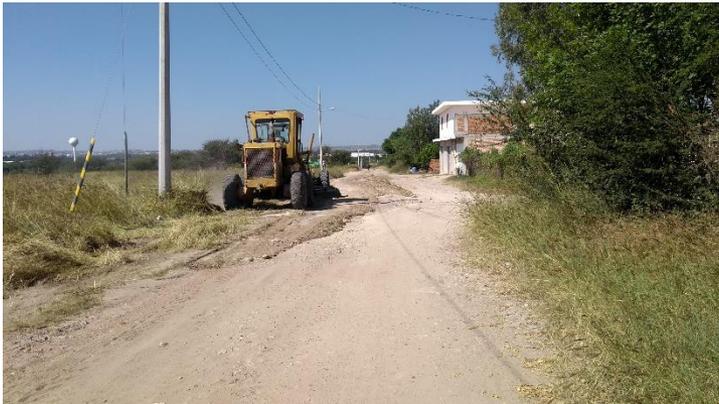

REPORTE MES DE OCTUBRE MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD SAN GERMAN

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
06/10/2020	CALLE DEL TEMPLO	M2	4,860	06/10/2020
	ATRIO DEL TEMPLO	M2	250	

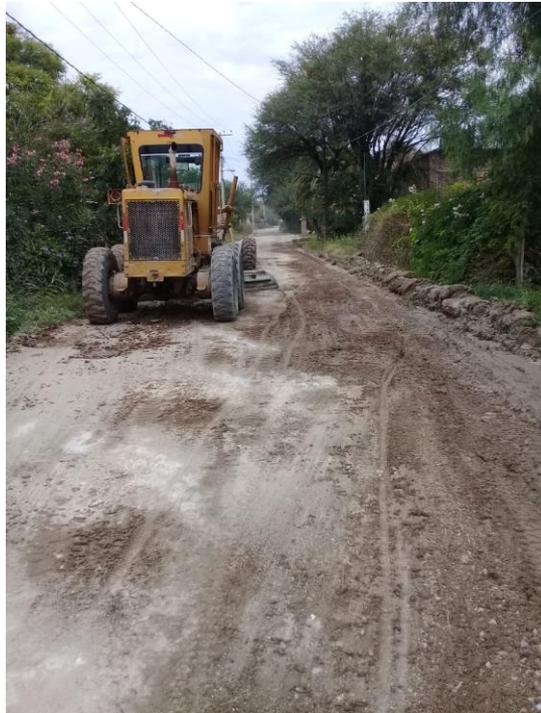


REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD LOMA DEL LIEBRERO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
07/10/2020	CALLE CASHIL	M2	850	07/10/2020



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD SAN ROQUE DE MONTES

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
09/10/2020	CALLE DOMINGO VELAZQUEZ	M2	310	09/10/2020

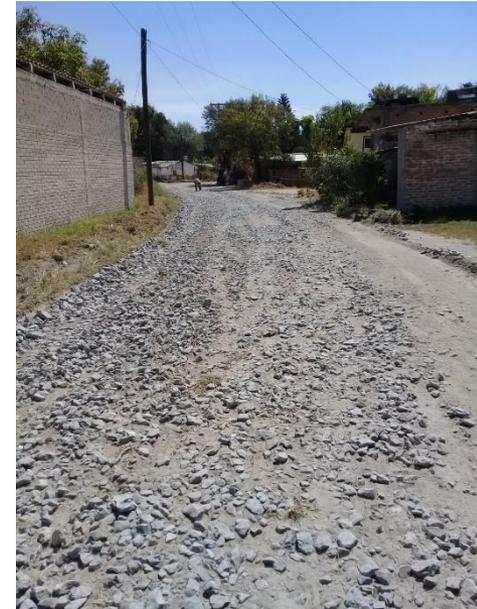

REPORTE MES DE OCTUBRE MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD LAS FUENTES

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
12/10/2020	CAMINO #1	M2	1,580	23/10/2020
	CAMINO #2	M2	2,130	
	CAMINO AL CERRO	M2	3,196	



CAMINO #1



CAMINO AL CERRO



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD LAS FUENTES

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
12/10/2020	CALLE #1	M2	1,580	30/10/2020
	CALLE #2	M2	2,130	
	CALLE #3	M2	1,938	
	CALLE #4	M2	550	



CALLE #1



CALLE #2



CALLE #3



CALLE #4

